ID	Aktivitetsl.	Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut	Föregående aktiviteter
1		Etableringsarbeten	2 dagar	må 21-05-03	ti 21-05-04	
2		**Ristorpsvägen**	**57 dagar**	**to 21-04-29**	**ti 21-08-10**	
3	✓	Schakt Sektion 0/200 -0/000	38 dagar	to 21-04-29	ti 21-06-22	
4	✓	Fyll Sektion 0/200 -0/000	43 dagar	on 21-05-05	ti 21-07-06	
5		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	on 21-07-07	ti 21-08-10	4
6		Återställningsarbeten	5 dagar	on 21-07-07	ti 21-07-13	4
7		**Risvägen**	**173,5 dagar?**	**on 21-05-05**	**to 22-02-10**	
8	✓	Sektion 0/000 -0/90	14 dagar	on 21-05-05	ti 21-05-25	
9	✓	Sektion 0/090 -0/200	18 dagar	ti 21-06-15	fr 21-07-09	16
10	✓	Sektion 0/090 -0/200	5 dagar?	må 21-07-12	fr 21-07-16	9
11		Sektion 0/200 -0/400	30 dagar	må 21-08-16	fr 21-09-24	10
12		Sektion 0/690 -0/400	70 dagar	må 21-10-04	må 22-01-24	11
13		Återställningarbeten	12,5 dagar	ti 22-01-25	to 22-02-10	12
14		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	ti 22-01-25	må 22-02-07	12
15		**Karbovägen**	**158 dagar**	**ti 21-05-25**	**må 22-02-07**	
16	✓	Sektion 0/000 - 0/050	15 dagar	ti 21-05-25	må 21-06-14	8
17		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	ti 22-01-25	må 22-02-07	12
18		**Pilrisvägen**	**40 dagar**	**må 21-11-29**	**må 22-02-07**	
19		Sektion 0/000 - 0/065	25 dagar	må 21-11-29	må 22-01-17	
20		Återställningarbeten	5 dagar	ti 22-01-25	må 22-01-31	12
21		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	ti 22-01-25	må 22-02-07	12
22		**Båtvägen**	**50 dagar**	**må 21-08-16**	**fr 21-10-22**	
23		Sektion 0/000 - 0/145	40 dagar	må 21-08-16	fr 21-10-08	
24		Återställningarbeten	10 dagar	må 21-10-11	fr 21-10-22	23
25		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	må 21-10-11	fr 21-10-22	23
26		**Sångfågelvägen**	**94 dagar**	**må 21-10-11**	**fr 22-03-04**	
27		Sektion 0/0 - 0/100 pkt. 185 - 218	35 dagar	fr 21-11-19	fr 22-01-21	29
28		Sektion 0/100 - 0/250 pkt. 218 - 209	30 dagar	må 22-01-24	fr 22-03-04	27
29		Sektion 0/0-0/70 pkt. 210 - 218	25 dagar	må 21-10-11	fr 21-11-12	23
30		Återställningarbeten	10 dagar	må 22-01-24	fr 22-02-04	27
31		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	må 22-01-24	fr 22-02-04	27
32		**Risbergsstigen**	**120 dagar**	**ti 22-01-25**	**må 22-08-08**	
33		Sektion 0/000 - 0/330	110 dagar	ti 22-01-25	må 22-07-04	12
34		Återställningarbeten	10 dagar	ti 22-07-05	må 22-08-08	33
35		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	ti 22-07-05	må 22-08-08	33
36		**Granrisvägen**	**25 dagar**	**må 21-09-06**	**fr 21-10-08**	
37		VA Sektion 0/0 -0/40	15 dagar	må 21-09-06	fr 21-09-24	
38		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	må 21-09-27	fr 21-10-08	37
39		**Almstigen**	**69 dagar**	**må 21-10-04**	**fr 22-01-21**	
40		VA Sektion 0/0 -0/90	25 dagar	må 21-10-04	fr 21-11-05	50
41		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	må 22-01-10	fr 22-01-21	43
42		**Lindestigen**	**44 dagar**	**må 21-11-08**	**fr 22-01-21**	
43		VA Sektion 0/0 -0/140	34 dagar	må 21-11-08	to 21-12-23	40
44		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	må 22-01-10	fr 22-01-21	43
45		**Grönavägen**	**79 dagar**	**må 21-09-20**	**fr 22-01-21**	
46		VA Sektion 0/0 -0/100	25 dagar	må 21-09-20	fr 21-10-22	49
47		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	må 22-01-10	fr 22-01-21	43
48		**Risvinkelvägen**	**126 dagar**	**on 21-06-23**	**fr 22-01-21**	
49	✓	Schakt VA Sektion 0/100 -0/380	47 dagar	on 21-06-23	fr 21-09-17	3
50		Fyll VA Sektion 0/100 -0/380	44 dagar	ti 21-07-13	fr 21-10-01	4
51		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	må 22-01-10	fr 22-01-21	43
52		**Enrisvägen**	**50 dagar**	**ti 22-11-29**	**on 23-02-08**	
53		Sektion 0/390 -0/235	40 dagar	ti 22-11-29	on 23-01-25	56
54		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	to 23-01-26	on 23-02-08	53
55		**Röde Orms väg**	**100 dagar**	**ti 22-07-05**	**må 22-12-12**	
56		Sektion 0/320-0/000	90 dagar	ti 22-07-05	må 22-11-28	33
57		Återställningsarbeten	10 dagar	ti 22-11-29	må 22-12-12	56
58		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	ti 22-11-29	må 22-12-12	56
59		**Fläderstigen**	**50 dagar**	**ti 22-02-01**	**må 22-04-11**	
60		Sektion 0/000 -0/110	40 dagar	ti 22-02-01	må 22-03-28	20
61		Återställningsarbeten	10 dagar	ti 22-03-29	må 22-04-11	60
62		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	ti 22-03-29	må 22-04-11	60
63		**Fösabacken**	**90 dagar**	**må 22-03-07**	**fr 22-07-15**	
64		Sektion 0/210 -0/170	20 dagar	må 22-03-07	fr 22-04-01	28
65		Sektion 0/000 -0/170	60 dagar	må 22-04-04	fr 22-07-01	64
66		Återställningsarbeten	10 dagar	må 22-07-04	fr 22-07-15	65
67		Provtryckning och vattenprover	10 dagar	må 22-07-04	fr 22-07-15	65

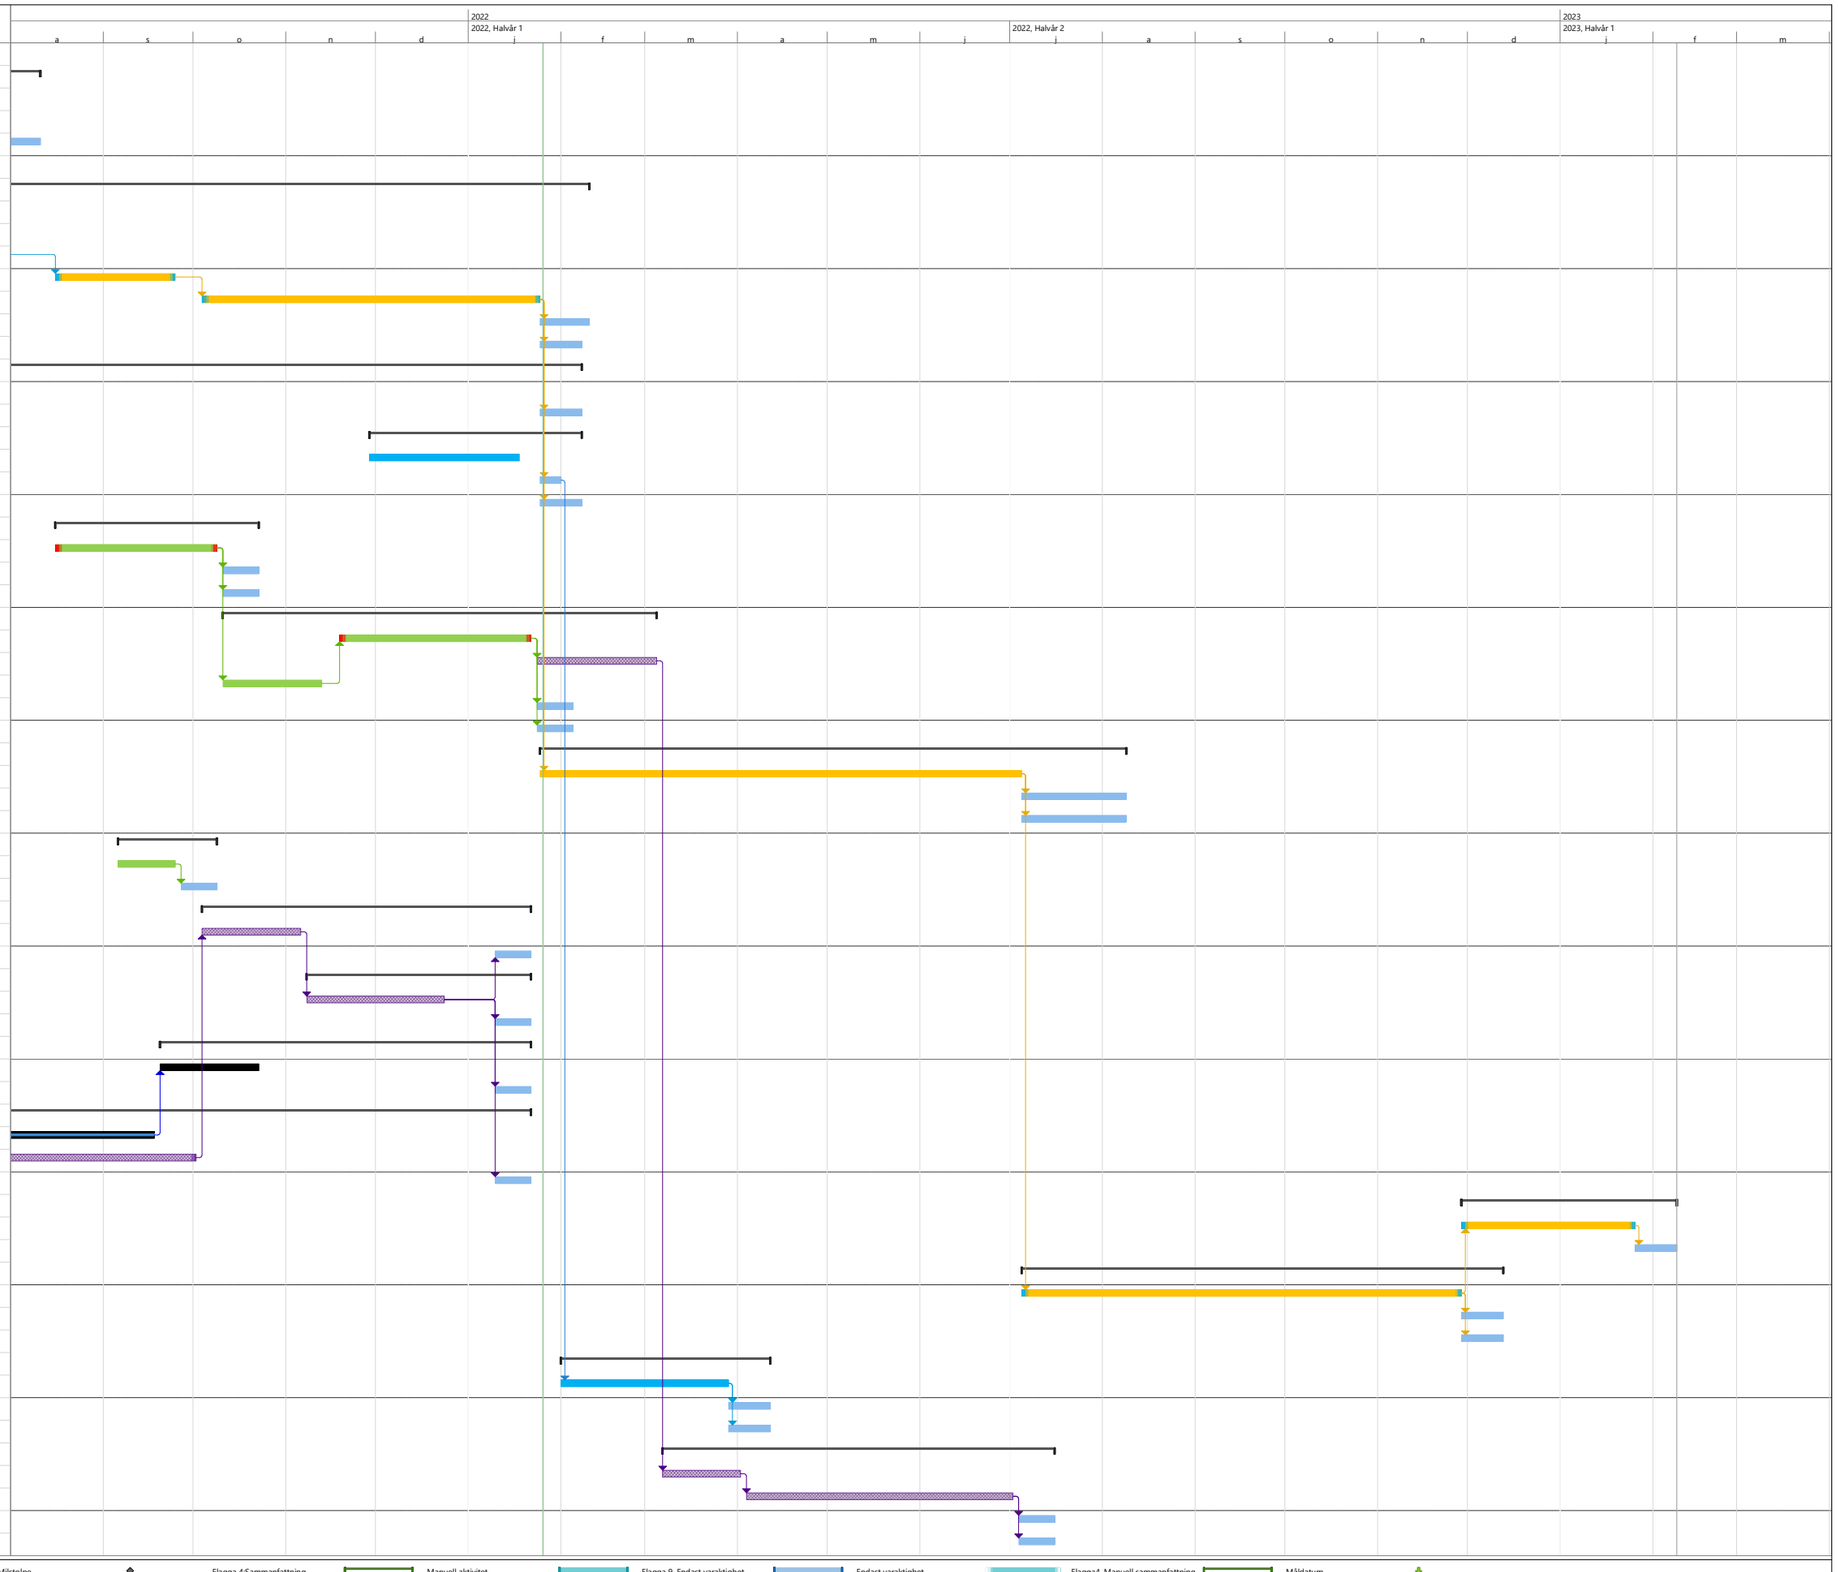

Projekt: Projektmall
Datum: on 22-01-26

Aktivitet
Aktivitet; Flagga 5
Aktivitet; Flagga 6
Aktivitet; Flagga 7
Aktivitet; Flagga 8
Aktivitet; Flagga 9
Aktivitet; Flagga 10
Aktivitet; Flagga 11
Aktivitet; Flagga 12
Delad
Milstolpe
Sammanfattning
Flagga 1;Sammanfattning
Flagga 2;Sammanfattning
Flagga 3;Sammanfattning
Flagga 4;Sammanfattning
Projektsammanfattning
Inaktiv aktivitet
Inaktiv milstolpe
Inaktiv sammanfattning
Manuell aktivitet
Flagga 5, Endast varaktighet
Flagga 6, Endast varaktighet
Flagga 7, Endast varaktighet
Flagga 8, Endast varaktighet
Flagga 9, Endast varaktighet
Flagga 10, Endast varaktighet
Flagga 11, Endast varaktighet
Flagga 12, Endast varaktighet
Upplyft manuell sammanfattning
Endast varaktighet
Manuell sammanfattning
Endast start
Endast slutdatum
Flagga2, Manuell sammanfattning
Flagga3, Manuell sammanfattning
Flagga4, Manuell sammanfattning
Flagga1, Manuell sammanfattning
Externa aktiviteter
Extern milstolpe
Måldatum
Förlopp
Manuellt förlopp
